





# Big bang implementatie

Office 365

Nova College



# Linda van Bakkum

**Rob Smit**  
**Informatie Manager Nova College**



Office 365 consultant  
linda@bp2d.nl



@bp2day  
www.bp2d.nl



# Agenda

- Het bedachte implementatieplan
- Bevindingen tijdens de implementatieplan
- Uiteindelijke uitvoering
- Leerpunten
- Succes
- Vragen?





# Facts & Figures

# Facts & Figures

Opgericht in 1996

Aantal studenten beroepsonderwijs 11.000

Aantal studenten Vavo 1.400

Aantal studenten cursussen 3.000

Aantal medewerkers 1.200

Locaties 18





# Welk verzorgingsgebied?





# Implementatie Office 365



# Huidige systemen

## Configuratie Laptops

- Windows 7
- Roaming profiles
- Office 2010
- H: schijf voor eigen bestanden
- P: schijf voor teambestanden
- SharePoint 2013 Teamsites
- Intranet SharePoint



Groot keuze  
pallet aan  
beschikbare  
tools

# Fasering implementatie

Start april 2016



Migratie  
Mail

Uitrol Office  
365 apps

# Welke tools voor onderwijs?

Adoptie belangrijk!

Vroege Vogel traject

- Aanmelding vrijwillig
- Groep per tool
- Samen onderzoeken mogelijkheden inzet in onderwijs
- Opleveren van trainings materiaal toegespitst op gebruik in onderwijs.
- Training vanuit het project



# Ultieme situatie?

- Weinig beschikbare tijd
- Overlapping in tools
- Groot verschil in digitale vaardigheden



# Project bijsturing

Niet zelf sturen, maar serveren van de oplossingen.

- 159 uur beschikbare tijd niet haalbaar
- Weinig ruimte voor training
- Verschil digitale vaardigheden versus snelheid serveren oplossing.



# Wat willen we?

Story mapping per rol

- Informatiebehoefte
- Welke platformen


Kennis halen bij andere scholen

Strategie Nova College


Resultaat: Functioneel ontwerp



## Portaal Novacollege



Docent

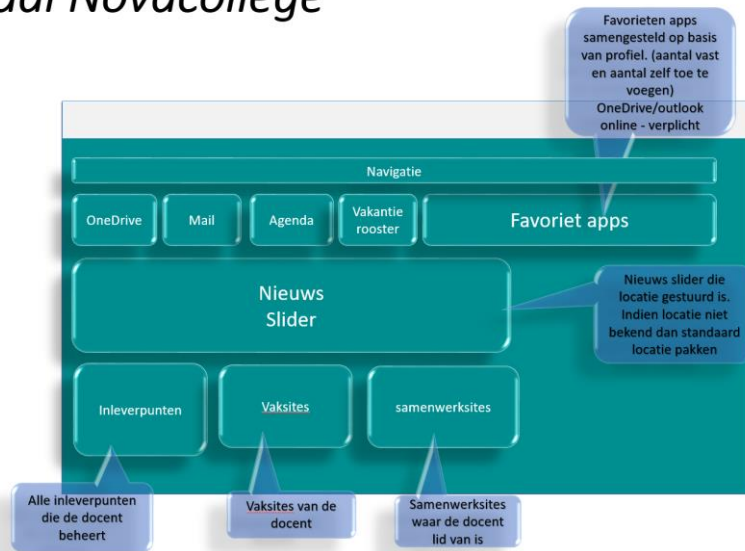


# Fundament voor slimmer/beter samenwerken



# Eenvoudigheid in opslag

2 locaties voor opslag  
documenten

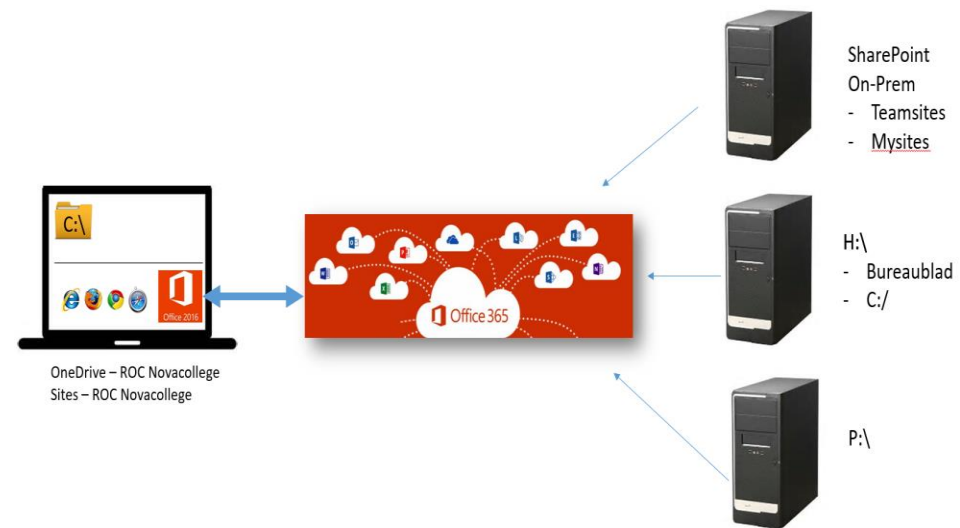

# Communicatieplan

Overbrengen van de boodschap.

Boodschap moet aansluiten bij strategie van Novacollge.

Verschillende communicatiemiddelen inzetten.

Per week nieuwe communicatie.  
Wat kunnen ze verwachten en wanneer..





Keep *the*  
MOMENTUM

Tijdens de vakantie, welke?

Functioneel ontwerp, impact op planning?

Technische planning?

# Uiteindelijke implementatie

- Uitrol OneDrive – migratie data
- Uitrol SharePoint – migratie Oude SharePoint (2013)
- Dichtzetten FileShare
- Roaming profile uitgezet

Migratieplan compleet.  
Implementatie februari 2017  
(voorjaarsvakantie)





# Na Voorjaarsvakantie

Pop-ups op locatie

Getrainde studenten op locatie

ISO ondersteunt collega's en begeleidt studenten op locatie

Communicatieplan uitvoeren!

Eerst uitrol Office 365 en dan  
groepen vormen

Creëer quickwins

Punten verloren uit  
Functioneel ontwerp

ISO's niet op alle locaties

# Leerpunten

Momentum niet verloren!

Studenten op locatie

Nu klaar om functionaliteiten  
bij de gebruikers te brengen!

Docenten kunnen overal op  
elk apparaat bij de benodigde  
informatie.

# Succes



Dank voor  
je aandacht

